


TERÉNNÍ ÚPRAVY ZÁMECKÉHO PARKU V MIMOŇI

E. Zásady organizace výstavby

E1. Technická zpráva

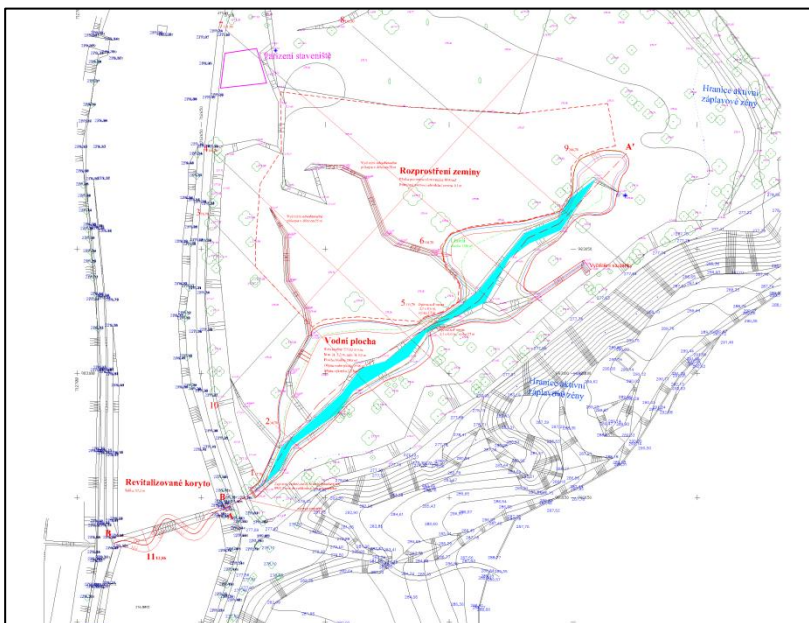

Zadavatel: Obec Mimoní
Mírová 120
471 24
Mimoní III

Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA.
Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0005423

Číslo zakázky: SL10030

Datum: 19. září 2013

Místo: Praha

Vypracovali: Ing. Kateřina Půstová

Aquion s.r.o.
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7
Česká Republika
T: 283 872 265
F: 283 872 266
E: info@aquion.cz
W: www.aquion.cz

Číslo přílohy / číslo pare:

Obsah

A)	STAVENIŠTĚ, DEPONIE, PŘÍJEZDY	3
B)	VÝZNAMNÉ SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	3
C)	NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA VODU, EL. ENERGII, ODVODNĚNÍ	3
D)	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ	3
E)	OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ	3
F)	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ŘEŠENÍ	4
G)	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, POPIS OBJEKTŮ, KTERÉ POTŘEBUJÍ OHLÁŠENÍ	4
H)	PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ Z HLEDISKA BOZP	4
I)	OCHRANA ŽP PŘI VÝSTAVBĚ	4
J)	LHŮTY VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ TERMÍNY	5

a) Staveniště, deponie, příjezdy

Stavba vodní plochy je situována na obecním pozemku číslo 2090 a 2091 v katastru města Mimoň. Stavbou bude zasažena středová část parku, stávající vodní plocha a podmáčené území. Dále bude využívána cesta parkem jako příjezdová cesta pro stavební stroje.

b) Významné sítě technické infrastruktury

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu technické infrastruktury.

c) Napojení staveniště na vodu, el. energii, odvodnění

Staveniště nepotřebuje zdroj vody. Spotřebu vody pro dělníky stačí pokrýt nákupem balené vody.

Stavební práce budou prováděny bez nároku na elektrickou energii. V případě nutnosti lze využít napájení pomocí dieselového agregátu. Např. pokud bude nutné odčerpání dešťové vody ze stavební jámy pomocí kalového čerpadla.

d) Bezpečnost a ochrana zdraví

Místa provádění výkopu budou vždy viditelně označena. Proti zamezení pádu osob do výkopů bude použito buď dřevěných zátaras, či plastových výstražných fólií. V místech zhoršené viditelnosti v nočních hodinách stavitel zajistí osvětlení místa výkopu. Při práci s jeřáby a těžkou technikou bude vždy jeden pracovník pověřen k zabránění vstupu nepovolaných osob do místa staveniště.

Při výstavbě bude nutno dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s bezpečnostními předpisy, poučení o užívání ochranných pomůcek a poučení o rizicích dle Zákoníku práce § 133, odst. 1 písm. B.

Stavba nevyžaduje úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) Ochrana veřejných zájmů

Při výstavbě nedojde k ohrožení podzemní vody ani jiných významných zdrojů. Stavitel zajistí, aby nedocházelo k znečištění a poškozování veřejných komunikací. Stavitel musí zabránit možnosti úniku ropných nebo jiných látek do podzemní nebo povrchové vody.

f) Zařízení staveniště, řešení

Zabezpečení staveniště a stavebního dvora si dojedná stavitel s obcí Mimoní.

g) Zařízení staveniště, popis objektů, které potřebují ohlášení

Žádný z objektů zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení.

h) Podmínky pro provádění z hlediska BOZP

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště staviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby staviteli k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo stavbě. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Dále bude pro dobu stavby vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik závodu Terezín k vyjádření a poté bude schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.

i) Ochrana ŽP při výstavbě

Při výstavbě nedojde k ohrožení životního prostředí. Po dobu výstavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí v zastavěném území. Vlivem stavební činnosti dojde ke zvýšení prašnosti, zvýší se hladina hluku provozem stavebních strojů a vozidel.

Ochrana stromů před mechanickým poškozením:

Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má chránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (ohraňovaná okapovou linií koruny) rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých forem o 5 m, po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné z prostorových důvodů zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypoštářovat. Nesmí být nasazeno

bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.

V kořenové zóně se nebude provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

j) Lhůty výstavby, rozhodující termíny

Předpokládá se, že stavba bude vybudována cca 6 měsíců od zahájení stavby, datum zahájení stavby závisí na finančních možnostech investora.

V Praze dne 19. září 2013

Ing. Kateřina Půstová
