

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení díla s názvem
Obnova mostu M-06, Brniště
uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 51/13 - 10561

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Brniště**
Se sídlem: Brniště č.p. 102, 471 29 Brniště
IČ : 00260401
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Česká Lípa
Číslo účtu : 6222421/0100
Zastoupený: Ing. Ivanem Pastorkem, starostou obce
Zastoupený TDI: Ing. Naděžda Hájková

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**
Se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ : 44564287
DIČ : CZ44564287
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu : 497945471/0100
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805
Zastoupený: Ing. Davidem Novákem, jednatelem
Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Davidem Novákem, jednatelem nebo
Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smluvních mimo podpisu smlouvy a případných dodatků:
Ing. Radek Kudrnáč, ředitel, tel. 602 482 737
Radim Hajšl, obchodní manažer, tel. 601 586 058

Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:
Radim Hajšl, obchodní manažer, tel. 601 586 058
Ing. Miroslav Jícha, hlavní stavbyvedoucí, tel. 606 683 847

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**Obnova mostu M-06, Brniště**” a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou společností KH Mosty a statik, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa v 9/2011 ve stupni DZS a těmito doklady:

- výzvou k předložení nabídky z 22.07.2013
- cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.8.2013

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Obnova mostu M-06, Brniště**” způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: 01.09.2013
4.2 Předání dokončeného díla: 31.10.2013

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	690 077,96 Kč
DPH 21%:	144 916,40 Kč
Cena včetně DPH:	834 994,36 Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. Porušením těchto parametrů ze zadávací dokumentace je zrušení platnosti této smlouvy.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro zadání stavby a objednatel předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc, vždy po skončení měsíce, včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 60 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.



7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených objednatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení

Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od doručení oznámení o výskytu vady tato odstraněna.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5 V případě nedodržení termínu dokončení stavby zaviněním zhotovitele přechází veškeré důsledky spojené s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele.

8 STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrýtím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrýtím, zhotovitel.

9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupce smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
- 9.15 Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN.

10 STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 10.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 10.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 11.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.

12 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- **60 měsíců na celý předmět plnění**
- Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou

13 VYŠŠÍ MOC

- 13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 13.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14 ZMĚNY SMLOUVY

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 14.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15 Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoli finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení objednateli.
- 15.2 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 15.3 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemně zrušení smlouvy o dílo
- 15.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

16 Záruční a pozáruční servis

- 16.1 Záruční a pozáruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců.
- 16.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 16.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 16.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 16.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).

- 16.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 16.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 17.1 Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 Obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 17.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 17.3 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s úhradou svých závazků, uchazeč rovněž není oprávněn své pohledávky vůči zadavateli zastavit či postoupit nebo jednostranně započítat.
- 17.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti
- 17.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 9.8.2013


V Litoměřicích, dne 30.8.2013

za zhotovitele



Ing. Radek Kudrnáč
ředitel

N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.

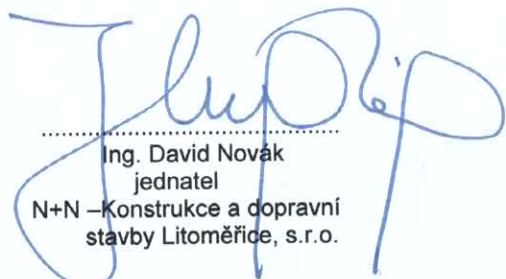


Ing. David Novák
jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.



V Brništi, dne 30.8.2013

za objednatele:



Ing. Ivan Pastorek
starosta obce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Most Brniště M-06
 Název objektu Brniště - Most M 06
 Název části Brniště

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Obec Brniště
 Projektant KH-Mosty
 Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

09.07.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	29 234,00	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	10 000,00
2		Montáž	489 751,17	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	57 910,56	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	18 556,23	11				16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		595 451,96	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)	10 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady	84 626,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		690 077,96	
						24	15 %	0,00 DPH	0,00	
Objednatel						25	21 %	690 077,96 DPH	144 916,40	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		834 994,36	
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele		0,00	
						28	Klouzavá doložka		0,00	
						29	Zvýhodnění + -		0,00	
Datum a podpis				Razítko						

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
 STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

N+N

Nerudova 2215
 412 01 Litoměřice
 DIČ: CZ44564267

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Brniště M-06
Objekt: Brniště - Most M 06
Část: Brniště
JKSO:
Objednatel: Obec Brniště
Zhotovitel:
Datum: 09.07.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	518 985,17
1	Zemní práce	91 400,13
2	Zakládání	120 171,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	98 222,31
4	Vodorovné konstrukce	57 946,76
5	Komunikace	55 374,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	95 870,69
99	Přesun hmot	38 436,29
PSV	Práce a dodávky PSV	76 466,79
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 946,79
767	Konstrukce zámečnické	47 520,00
000	Nepojmenované práce	84 626,00
0	Ostatní opatření	84 626,00
	<u>Celkem</u>	<u>680 077,96</u>

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O. **N+N**®
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287



ROZPOČET

Stavba: Most Bmístě M-06
Objekt: Bmístě - Most M 06
Část: Bmístě
JKSO:

Objednatel: Obec Bmístě
Zhotovitel:
Datum: 09.07.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce				518 985,17	
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	21,300	95,00	2 023,50	21,0
				1,5*7+3*3,6		21,300			
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	21,300	76,00	1 618,80	21,0
				21,3		21,300			
3	K	221	113154234	Frézování živého křtu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	9,644	550,00	5 304,20	21,0
				1,5*7+(3,6+2,3)*6,93/2-21,3		9,644			
4	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	11,000	1 200,00	13 200,00	21,0
5	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	15,00	3 000,00	21,0
6	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	6,00	120,00	21,0
7	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	31,668	189,90	6 013,75	21,0
				2,1*8,35*0,8		14,028			
				10,5*2,1*0,8		17,640			
				Součet		31,668			
8	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	5,060	317,00	1 604,02	21,0
				2,3*11*0,2		5,060			
9	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,400	317,00	3 613,80	21,0
				0,6*8,5+0,8*10,5		11,400			
10	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	48,128	63,00	3 032,06	21,0
				31,668+11,4+5,06		48,128			
11	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,000	190,00	5 320,00	21,0
12	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	420,000	13,00	5 460,00	21,0
				28		28,000			
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,000	63,00	1 764,00	21,0
14	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	50,400	180,00	9 072,00	21,0
				28*1,8		50,400			
15	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	40,500	200,00	8 100,00	21,0
16	M	MAT	583373700	šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	36,450	520,00	18 954,00	21,0
				40,5/2		20,250			

Il

17	K	232	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	50,000	32,00	1 600,00	21,0
18	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	32,00	1 600,00	21,0
19	K	211	212341111	Zakládání Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	3,620	2 785,00	120 171,28 10 081,70	21,0
20	K	211	212792211	0,4*0,5*(7,6+10,5) Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	3,620 18,100	190,00	3 439,00	21,0
21	K	211	273311123	7,6+10,5 Základové desky z betonu prostého C 8/10	m3	1,810	3 418,00	6 186,58	21,0
22	K	211	274321117	(7,6+10,5)*1*0,1 Základové pásy, prahy, větce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	1,810 11,104	3 300,00	36 643,20	21,0
23	K	211	274354111	(7+4,35)*0,8*0,8 8*0,6*0,8 Součet Bednění základových pásů - zřízení	m2	7,264 3,840 11,104 33,520	800,00	26 816,00	21,0
24	K	211	274354211	(7+4,35)*0,8*2 8*2*0,8 0,8*0,8*4 Součet Bednění základových pásů - odstranění	t	12,800 2,560 33,520 33,520	190,00	6 368,80	21,0
25	K	211	274361116	Výztuž základových pásů, prahů, větců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	1,332 1,332	23 000,00	30 636,00	21,0
26	K	211	317171126	11,1*0,12 Svislé a kompletní konstrukce Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	8,000	126,00	98 222,31 1 008,00	21,0
27	M	MAT	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	8,000	380,00	3 040,00	21,0
28	K	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,634	3 798,00	2 407,93	21,0
29	K	211	317353121	3,3*2*0,4*0,115 3,3*2*0,25*0,2 Součet Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,304 0,330 0,634 5,840	1 202,00	7 019,68	21,0
30	K	211	317353221	3,3*2*0,8 0,4*0,35*4 Součet Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	t	5,280 0,560 5,840 5,840	25 320,00	1 949,64	21,0
31	K	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,077 0,077	3 500,00	10 080,00	21,0
32	K	321	321222311	0,64*0,12 Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádřového objem do 0,2 m3	m3	2,880	300,00	2 160,00	21,0
33	M	MAT	563810750	kámen lomový	t	7,200	3 600,00	23 083,20	21,0
34	K	211	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	6,412	3 780		
				1,08*0,5*7 1,21*0,5*4,35 Součet		2,632 6,412			

Kil

35	K	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení 1,08*2*7	m2	27,937 15,120	823,00	22 992,15	21,0
				1,21*2*4,35		10,527			
				1,21*0,5*2+1,08*0,5*2		2,290			
				Součet		27,937			
36	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	27,937	190,00	5 308,03	21,0
37	K	211	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505 6,4*0,12	t	0,768	24 000,00	18 432,00	21,0
				Vodorovné konstrukce				57 946,76	
38	K	211	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 19,23*0,25	m3	4,808	3 600,00	17 308,80	21,0
39	K	211	421351111	Bednění mostovky - zřízení 19,23	m2	19,230	950,00	18 268,50	21,0
40	K	211	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení 3,3*2*0,25+11,35*0,25	m2	4,488	253,00	1 135,46	21,0
41	K	211	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 4,8*0,12	t	0,576	24 000,00	13 824,00	21,0
42	K	211	428382111	Osazení vrubového kloubu z prefra dílu	kus	13,000	127,00	1 651,00	21,0
43	M	MAT	548790270	kotva mechanická pro těžké kotvení (se šestihlannou hlavou) HSL - 3 M 24/60	kus	13,000	190,00	2 470,00	21,0
44	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně 2,3*1*0,2	m3	5,060	650,00	3 289,00	21,0
				Komunikace				55 374,00	
45	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm 31	m2	31,000	510,00	15 810,00	21,0
46	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 19,23	m2	19,230	20,00	384,60	21,0
47	K	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,230	390,00	19 589,70	21,0
48	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,230	390,00	19 589,70	21,0
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				95 870,69	
49	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	18,000	250,00	4 500,00	21,0
50	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	18,000	145,00	2 610,00	21,0
51	K	PK	919000R1	Zábřana - zřízení a odstranění	soubor	2,000	300,00	600,00	21,0
52	K	221	919121223	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsníčního profilu 11,35+3,3*2	m	17,950	190,00	3 410,50	21,0
53	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	11,350	114,00	1 293,90	21,0
54	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	140,00	4 480,00	21,0
55	K	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	32,000	160,00	5 120,00	21,0
56	K	211	961021112	Bourání mostních základů z kamene 10*0,6*0,8	m3	4,800	2 300,00	11 040,00	21,0

57	K	211	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	2,000	2 300,00	4 600,00	21,0
58	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 10*1,2*0,4	m3	4,800	2 300,00	11 040,00	21,0
59	K	211	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB 19*0,2	m3	3,800	2 300,00	8 740,00	21,0
60	D	99	997013501	Přesun hmot				38 436,29	
61	K	013	97013509	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,076	82,00	4 598,23	21,0
62	K	013	97013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 065,444	11,00	11 719,88	21,0
63	K	013	97013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	56,076	280,00	15 701,28	21,0
64	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	128,338	50,00	6 416,90	21,0
65	D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 466,79	
66	D	711	711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 946,79	
67	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	35,330	76,00	2 685,08	21,0
68	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,014	31 650,00	443,10	21,0
69	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	10,350	25,00	258,75	21,0
70	M	MAT	685367500	textilie IZOCHLAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	3,623	63,00	228,25	21,0
71	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	70,660	140,00	9 892,40	21,0
72	M	MAT	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	81,259	190,00	15 439,21	21,0
73	D	767		Konstrukce zámečnické				47 520,00	
74	K	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	440,000	13,00	5 720,00	21,0
75	M	MAT	628R	zábradlí pozink.	kg	440,000	95,00	41 800,00	21,0
76	D	000		Nepojmenované práce				84 626,00	
77	D	0		Ostatní opatření				84 626,00	
78	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení	Kč	1,000	5 064,00	5 064,00	21,0
79	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření	Kč	1,000	5 064,00	5 064,00	21,0
80	K	000	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00	21,0
81	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
82	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	3 798,00	3 798,00	21,0
83	K	000	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
84	K	000	041203000	Provizorní lávka pro pěši	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
85	K	000	041403000	1.Hlavní mostní prohlídka	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
86	K	000	042002000	Mostní list	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
87	K	000	042503000	Havarijní a povodňový plán	Kč	1,000	4 700,00	4 700,00	21,0
88				Celkem				680 077,96	

Handwritten signature
